KÄSTLI

Projekt: ISP Mülibahc, Mühlethurnen
Stand 23.09.2024

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1					
2	Offereinladung	0 Tage	Mit 26.06.24	Mit 26.06.24	
3	Angebotsbearbeitung	35 Tage	Mit 26.06.24	Don 15.08.24	2
4	Eingabetermin Angebot	0 Tage	Don 15.08.24	Don 15.08.24	3
5	Angebotsprüfung	10 Tage	Mon 19.08.24	Fre 30.08.24	4EA+1 Tag
6	Erteilung des Zuschlags	0 Tage	Fre 30.08.24	Fre 30.08.24	5
7	Einsprachefrist	15 fTage	Fre 30.08.24	Sam 14.09.24	6
8	Beginn der vertraglichen Arbeiten	0 Tage	Mon 16.09.24	Mon 16.09.24	7EA+1 Tag
9	AVOR	25 Tage	Die 17.09.24	Mon 21.10.24	8
10					
11	Baubeginn		Mon 21.10.24		9
12					
13	Baustelleninstallation	3 Tage	Mon 21.10.24	Mit 23.10.24	11AA-1 Tag
14	Erstellen Baupiste	2 Tage	Don 24.10.24	Fre 25.10.24	13
15	Wasserhaltung Abschnitt 1 -2	3 Tage	Mon 28.10.24	Mit 30.10.24	14
16	Abschnitt 1	30 Tage	Don 31.10.24	Mit 11.12.24	
17	Rückbau Ufermauer	1 Tag	Don 31.10.24	Don 31.10.24	15
18	Umlegung Brunnenleitung	1 Tag	Fre 01.11.24	Fre 01.11.24	17
19	Sicherung Mauerfuss rechtes Ufer	3 Tage	Mon 04.11.24	Mit 06.11.24	18
20	Abtrag Uferböschung	8 Tage	Don 07.11.24	Mon 18.11.24	19
21	Erstellen Sohlensicherung / Schwellen	8 Tage	Die 19.11.24	Don 28.11.24	20
22	Erstellen Blocksatz linkes Ufer	7 Tage	Fre 29.11.24	Mon 09.12.24	21
23	Einbau Kiessohle	2 Tage	Die 10.12.24	Mit 11.12.24	22
24	Winterpuffer (Reserve)	12 Tage	Don 12.12.24	Fre 10.01.25	23
25	Abschnitt 2	20 Tage	Mon 13.01.25	Fre 07.02.25	
26	Unterfangungen best. Ufermauer	8 Tage	Mon 13.01.25	Mit 22.01.25	24
27	Einbau Holzschwellen	12 Tage	Don 23.01.25	Fre 07.02.25	26
28	Wasserhaltung Abschnitt 3	2 Tage	Mon 10.02.25	Die 11.02.25	27
29	Abschnitt 3	20 Tage	Mit 12.02.25	Die 11.03.25	
30	Unterfangungen best. Ufermauer	8 Tage	Mit 12.02.25	Fre 21.02.25	28
31	Einbau Holzschwellen	10 Tage	Mon 24.02.25	Fre 07.03.25	30
32	Wiederaufbau Ufermauer	2 Tage	Mon 10.03.25	Die 11.03.25	31
33	Rekultivierung / Bepflanzng	8 Tage	Mit 12.03.25	Fre 21.03.25	32
34	Räumung der Baustelle	2 Tage	Mon 24.03.25	Die 25.03.25	33
35	Pufferzeit (Reserve)	8 Tage	Mit 26.03.25	Fre 04.04.25	34
36					
37	Bauende		Fre 04.04.25		35
38					

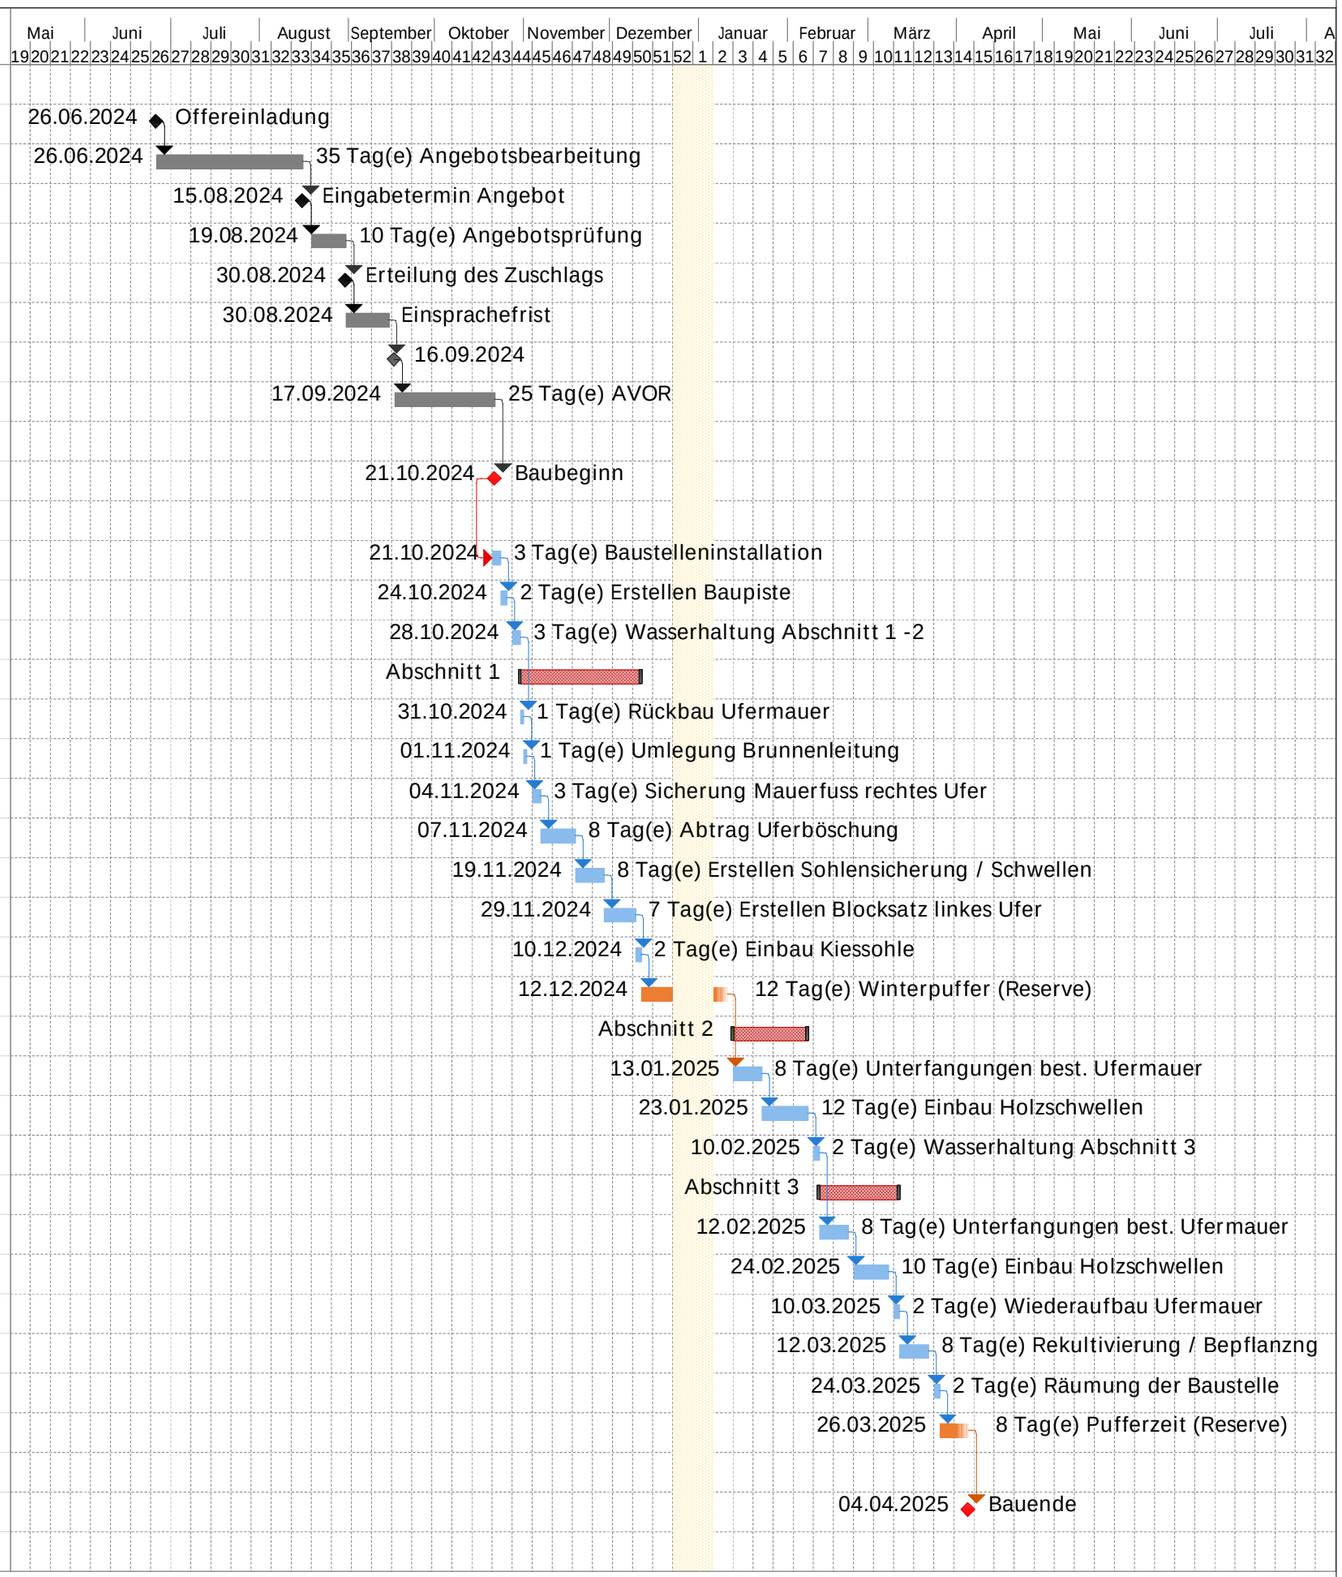

Kästli Bau AG
Altes Riedgässli 2
3113 Rubigen

Erstellt am Mon 23.09.24
